



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



ДОГОВОР

по обществена поръчка с предмет „Виртуална обсерватория на Пътя на коприната”

7215- № 44 / 01.04.2020 г.

Днес, 01.04 2020г., в гр. Варна, на основание утвърдени протоколи вх.№ РД-20-491/08.05.2020г., и вх.№ РД-20-528/22.05.2020г. за резултатите от оценка на получените оферти по обществена поръчка обявена по реда на чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП и решение № РД-14-1209/04.06.2020г. на Зам.-ректора ФПД на ИУ-Варна за избор на изпълнител на обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет: „Виртуална обсерватория на Пътя на коприната” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната”, акроним SILC, финансиран от съвместна Оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“, обявена по реда на чл.20, ал.3, т.3 и глава двадесет и шеста от ЗОП между:

1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, със седалище и адрес на управление гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77, идентификационен номер по БУЛСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван на основание заповед № РД 14-1523/12.06.2019г. от доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров - Зам.-ректор по ФПД и на основание заповед № РД 14-2515/30.08.2019г. от Гергана Пенчева Нанева – Заместник главен счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ФИЛ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, община Варна, област Варна, п.к.9000, ул.“Д-р Заменхоф” №10, ет.2 с адрес за кореспонденция гр.Варна, п.к.9000, ул.“Любен Каравелов” 77, ет.1, идентификационен номер по БУЛСТАТ 813198547, идентификационен номер по ДДС BG813198547, представлявано от Георги Христов Филипов - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,,

се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изготви:

1.1. Окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“, предаден в срок до 28.02.2021г. в 2 (два) екземпляра: един на български и един английски език (на хартиен носител), придружени от 1 (един) магнитен носител, съдържащ електронния вариант на документите на двата езика.

1.2. Окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“, предаден в срок до 31.07.2020г. в 2 (два) екземпляра: един на български и един английски език (на хартиен носител), придружени от 1 (един) магнитен носител, съдържащ електронния вариант на документите на двата езика.



Project funded by
EUROPEAN UNION



Slik Road Local Culture



1.3. Окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“, предаден в срок до 28.02.2021г. в 2 (два) екземпляра: един на български и един английски език (на хартиен носител), придружени от 1 (един) магнитен носител, съдържащ електронния вариант на документите на двата езика, наричани за краткост „Услугата“, по цена, размер, при условията и до обекти, съгласно в настоящия Договор и съгласно приложенията към него.

Окончателните варианти на всички продукти на обществената поръчка и приложенията към тях следва да бъдат представени на български и английски език в съответните срокове на хартиен и на електронен носител, като се завеждат в деловодството на ИУ-Варна. Крайните продукти се предоставят в един оригинал и едно копие на хартиен и един екземпляр на електронен носител (CD).

В срок от три работни дни от предаването на всеки един завършен продукт от изпълнението на обществената поръчка, Възложителят се произнася по степента на съответствие на изпълнението спрямо обхвата на възлагането.

В случаите, когато Възложителят установи неясноти относно информацията, съдържаща се в докладите на български и английски език и приложенията към тях, както и при възникнали проблеми, той дава писмени предписания за корекции и допълнения, които Изпълнителят следва да отрази. Изпълнителят приема да отговори в рамките на три работни дни на всички получени от Възложителя коментари относно материалите. След корекция на документите се подписва приемно-предавателен протокол.

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема Услугата, съгласно ценовите параметри и предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, съставляващи съответно Приложения № 1 и № 2 към настоящия Договор („Приложенията“), неразделни части от настоящия договор.

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.3. Срокът на Договора е 28.02.2021г.

Чл.4. Мястото за входиране на докладите е в гр.Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, Учебен корпус – 1 на Икономически университет - Варна.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл.5.(1) За извършване на Услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума на в размер общо на 32 600.00лв. (тридесет и две хиляди и шестотин лева) без вкл. ДДС и 39 120.00лв. (тридесет и девет хиляди сто и двадесет лева) с вкл. ДДС, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му параметри, наричана по-нататък „Цената“.

(2) В Цената по ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугата, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разходи, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна [Единичните [цени/стойности] за отделните [дейности/етапи/задачи], свързани с изпълнението на Услугата, посочени в Ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна.

(4) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора и не може да бъде променяна и се заплаща както следва:



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



- 30% или 9 780.00лв. (девет хиляди седемстотин и осемдесет лева) лева без ДДС и 11 736.00лв. (единадесет хиляди седемстотин тридесет и шест лева) с вкл. ДДС в срок от 5 /пет/ работни дни от приемане с приемо-предавателен протокол на окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- 40% или 13 040.00лв. (тринадесет хиляди и четиридесет лева) без вкл. ДДС и 15 648.00 (петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева) с вкл. ДДС в срок от 5 /пет/ работни дни от приемане с приемо-предавателен протокол на окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- 30% или 9 780.00лв. (девет хиляди седемстотин и осемдесет лева) лева без ДДС и 11 736.00лв. (единадесет хиляди седемстотин тридесет и шест лева) с вкл. ДДС в срок от 5 /пет/ работни дни от приемане с приемо-предавателен протокол на окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл.6.(1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 10 (десет) работни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал.1.

Чл.7.(1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ТБ „УниКредит Булбанк“ АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG94 UNCR 7000 1522 5442 31.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл.8. При подписването на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора „Гаранция за изпълнение“ в размер, на 3 /три на сто/ от Стойността на Договора без ДДС, а именно 978.00лв. /деветстотин седемдесет и осем лева/.

Чл.9. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка, както следва:

Банка: ТБ „БАНКА ДСК“ ЕАД – клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64 STSA 9300 3329 2762 00.



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



Black Sea
CROSS BORDER
COOPERATION

Чл.10.(1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, съдържаща задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора и е със валидност след 01.03.2021г.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11.(1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 10 (десет) работни дни след прекратяването на Договора - приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Доставките - в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.9 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на [застрахователната полица/застрахователния сертификат] на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Доставките не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора на това основание;



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл.15. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл.16. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (*пет*) работни дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.9 от Договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.17. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да предаде с приемо-предавателен протокол и да входира в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ докладите, съгласно настоящия договор;
3. да извършва всички необходими действия така, че да осигури изпълнението на настоящия договор;
5. да поеме всички разходи, свързани с изготвянето и превеждането на докладите;
6. да получи суми в размера, сроковете и при условията на настоящия договор;
7. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осъществи Услугата и да изпълнява задълженията си по настоящия Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.34 от настоящия Договор;

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи Услугата в срок и с необходимото качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора;

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми в размера, по реда и при условията, предвидени в настоящия Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугата, предмет на настоящия Договор, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.34 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на този Договор, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл.12 от настоящия Договор.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.22. При неизпълнение на задълженията по настоящия Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 5% (пет на сто) за всеки ден, но не повече от 10% (десет на сто) от Стойността на договора.

Чл.23. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено предмета на настоящия договор, без да дължи допълнителна цена за това. В случай, че и повторното изпълнение на доставката е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл.24. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл.26. Плащането на неустойките, уговорени в настоящия Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.27.(1) Настоящият Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл.3 или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) календарни дни от настъпване на невъзможността, като представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;



Project funded by
EUROPEAN UNION



Slik Road Local Culture



2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.28. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл.30. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- а) да преустанови изпълнението на Услугата;
- б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички заявени доставки до датата на прекратяването;
- в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл.31. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално приетата по установения ред Услуга.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл.32.(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в настоящия Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми

Чл.33. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл.34.(1) Всяка от Страните по настоящия Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциалната информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.1 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Чл.35. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл.37. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от настоящия Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл.38. Настоящият Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл.39.(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



(3) Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила;
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл.40. В случай, че някоя от клаузите на настоящия Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл.41.(1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр.Варна, п.к.9002, бул. "Княз Борис I" №77

Тел.: 0887 247453

Факс: 052 643 365

e-mail: krasimira_vancheva@ue-varna.bg

Отговорно лице за изпълнение: гл. ас. д-р Красимира Янчева

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр.Варна, п.к.9000, ул. "Любен Каравелов" 77, ет.1

Тел.: 052 610 306


Факс: 052 610 307

e-mail: office@fil.bg

Отговорно лице за изпълнение: Георги Филипов – Управител.

(3) За дата/час на уведомлението се счита:

1. датата/часа на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата/часа на приемането – при изпращане по факс;
4. датата/часа на получаване – при изпращане по електронна поща.



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените отговорни лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл.42. Настоящият Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл.43. Всички спорове, породени от настоящия Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл.44. Настоящият Договор се състои от 9 (девет) страници и е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл.45. Към настоящия Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Копие от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 2 – Копие от ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 3 – Копие от гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информацията е заличена
на Основание чл. 4, т. 1

ЗАМ.-РЕКТОР ОНД: от Регламент ЕС 2016/679

/доц. д-р Божидар Чапарев/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Информацията е заличена

УПРАВИТЕЛ: на Основание чл. 4, т. 1


/Георги Фот Регламент ЕС 2016/679

ЗАМ.-ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Информацията е заличена
на Основание чл. 4, т. 1

/Лергана Нанева/ от Регламент ЕС 2016/679

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на настоящия документ е изцяло отговорност на Икономически университет – Варна и по никакъв начин не отразява позиции на Управляващия орган или Европейския съюз.



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



Приложение 6

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Подписаният/ата Георги Христов Филипов

(трите имена)

в качеството си на управител на „ФИЛ“ ООД

(длъжност)

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ BG 813198547

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ-РЕКТОР,

След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Виртуална обсерватория на Пътя на коприната“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 „Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България, ние предлагаме за срока на договора да извършваме услугата, като предлагаме за показател „Финансова оценка на предложението“ за представен завършен краен продукт, включващ:

○ Изготвяне на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“, предаден в срок до **28.02.2021** в 2 (два) екземпляра: един на български и един английски език (на хартиен носител), придружени от 1 (един) магнитен носител, съдържащ електронния вариант на документите на двата езика на стойност 9780.00 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева без вкл. ДДС.

○ Изготвяне на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“, предаден в срок до **31.07.2020** в 2 (два) екземпляра: един на български и един английски език (на хартиен носител), придружени от 1 (един) магнитен носител, съдържащ електронния вариант на документите на двата езика на стойност 13040.00 (тринадесет хиляди и четиридесет) лева без вкл. ДДС..

○ Изготвяне на Окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“, предаден в срок до **28.02.2021** в 2 (два) екземпляра: един на български и един английски език (на хартиен носител), придружени от 1 (един) магнитен носител, съдържащ електронния вариант на документите на двата езика на стойност 9780.00 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева без вкл. ДДС.

за всички материали и доклади на български език и в превод на английски език и приложения към тях в сроковете, съгласно документацията по обществената поръчка на хартиен носител и на електронен носител, на обща стойност 32600 (тридесет и две хиляди и шестстотин) лева без вкл. ДДС.

(посочва се с точност до втория знак след десетичната запетая – цифром и словом).

Дата	27.04.2020
Име и фамилия	Георги Филипов
Подпис на лицето (и печат)	



АВИЗО ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ



Номер на операцията / Operation number 301B1002017500S7		Дата и час на операцията / Operation date time 23.06.2020 13:59:38	
Платеж на име на получателя / Beneficiary Name Икономически Университе - Варна			
IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG64STSA93003329276200		BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC STSA BG SF	
При банка - име на банката на получателя / Bank Name БАНКА ДСК		Вид плащане** / Payment Type 000000	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за плащане от/към бюджета		Валута / Currency BGN	Сума / Amount 978.00
PAYMENT ORDER for Budget Payment			
Основание за плащане / Details of Payment Гаранция за изпълнение на дог.			
Още пояснения / Additional Details по ОП с реш.ном.РД-14-1209/04.06.20			
Вид док. / Type 9	Номер на документа, по който се плаща / Number of Document		Дата на документа / Date
Период, за който се плаща / Period of Payment От дата / From Date		До дата / To Date	
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Debtor Person - Legal Entity or Individuals ФИЛ ООД			
БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT 813198547		ЕГН на задълженото лице / Personal Number	ЛНЧ на задълженото лице / Personal ID
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ФИЛ ООД			
IBAN на наредителя / Ordering Customer IBAN BG94UNCR70001522544231		BIC на банката на наредителя / Ordering Bank BIC UNCR BG SF	
При банка - име на банката на наредителя / Bank Name УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД			
Платежна система / Payment System BISERA		Такси** / Taxes 2	Вид плащане** / Payment Type 000000
Дата на регистрация / Payment system registration date 23.06.2020		Номер на регистрация / Payment system registration number	
*Вид документ: 1 - декларация 2 - разписан акт 3 - наказ, постановление 4 - авансова вноска 5 - парт, номер на вмот 6 - постановление за принудително събиране 9 - други **Такси: 1 - за сметка на наредителя 2 - споделяна (стандарт за местни праводы) 3 - за получателя ***Вид плащане - попълва се за сметка на административна на приходи и на Централния бюджет			

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



Георги Фучков 23.06.20

Приложение 5

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ**

НА УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЕНА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
– ВАРНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „**ВИРТУАЛНА ОБСЕРВАТОРИЯ НА ПЪТЯ НА
КОПРИНАТА**“ / КОД, СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК /CPV/:
7124 1000/ ПО ПРОЕКТ С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР BSB 570 “МЕСТНАТА КУЛТУРА ПО
ПЪТЯ НА КОПРИНАТА“, АКРОНИМ SILC, ФИНАНСИРАН ПО СЪВМЕСТНА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-
2020“ И СЪФИНАНСИРАН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подписаният/ата Георги Христов Филипов

(трите имена)



в качеството си на управител на „ФИЛ“ ООД

(длъжност)

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ BG 813198547

Съгласно публикувана в профила на купувача на Икономически университет - Варна и в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки процедура по обявена обществена поръчка, при ред за възлагане събиране на оферти с обява с предмет: „**ВИРТУАЛНА ОБСЕРВАТОРИЯ НА ПЪТЯ НА КОПРИНАТА**“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран от съвместна Оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“ и след като се запознахме с условията за участие, приемаме да изпълним обществената поръчка, съгласно изискванията на възложителя и предоставяме на вниманието Ви настоящото предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, ние предлагаме:

1.  2.  3. 



Project funded by
EUROPEAN UNION



Slik Road Local Culture



1. Съгласно ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ в изготвянето на доклад за изпълнение на дейност А.Т.3.1. „Създаване на Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ за изпълнение на дейност А.Т.3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ се включват следните основни части:

1. ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. Описание на планираните дейности, целите, очаквани резултати и методи за постигане на резултатите

Окончателният доклад за изпълнение на дейност А.Т.3.1. „Създаване на Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ за Изпълнение на Дейност А.Т.3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ ще подпомогне практическото реализиране на Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC) от страна на гръцкия партньор.

Географският обхват на изпълнението на дейност А.Т.3.1 ще се определя по класификацията на NUTS 2016, която засяга NUTS II Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България във връзка с териториалния обхват на партньорските организации NUTS II район Централна Македония (EL52) и NUTS II район Източна Македония и Тракия (EL51) на Гърция; всички райони на Армения (AM00); всички райони на Грузия (GE00) и NUTS II Югоизточен район на Румъния (RO22).

Методологията за реализирането на Основна дейност А.Т.3.1 ще се основава предимно на управленски и организационно-технически компетентности и решения от изпълнителя за осъществяване на планираните резултати в тази част от проекта SILC.

За изпълнението на Основна дейност А.Т.3.1 предлагаме постапно извършването на долупосочените конкретни дейности, резултатите от които ще представим с:

- Доклад за резултат **D.Т.3.1.1** „Дизайн на уеб платформа“;
- Доклад за резултат **D.Т.3.1.2** „Съдействие за изграждане и изпълнение на уеб ГИС (географска информационна система)“;
- Доклад за резултат **D.Т.3.1.3** „Съдействие при разработването и мониторинг на уеб ГИС“;
- Доклад за резултат **D.Т.3.1.4** „Разработване на съдържание за въвеждане на данни в уеб ГИС платформа“;
- Доклад за **D.Т.3.1.5** „Съдействие за изготвяне на видео (документален филм) за разказване на истории и споделяне на опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“;
- Доклад за **D.Т.3.1.6** „Съдействие за управление на данни на видео (документален филм) за разказване на истории и опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“

При изпълнението на Основна дейност А.Т.3.1, като краен продукт ще се представят следните резултати от изпълнителя:

Доклад за резултат **D.Т.3.1.1** ще е свързан със създаването на методика за организирането на входящите данни от страните-партньори и в частност от дестинация България с цел постигането на изцяло съвместими решения в контекста на дизайна и



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



архитектурата на уеб платформата при отчитане на нейните основни конструктивни елементи – ГИС, SILCNET мрежата и приложението за разпознаване на SILC местоположение. Методиката за организирането на входящите данни ще да гарантира:

2. Осигуряването / проверка на качеството на превода на информацията на английски език;
3. Процеса на валидизиране на данните;
4. Подпомагане процеса на споделяне на знание и опит за местното културно наследство По Пътя на коприната.

Доклад за резултат D.T3.1.2, който ще бъде съставна част от „Карта на местните култури по пътя на коприната“. Докладът ще има за цел подпомагане на процесите на картографирането и оценката на въздействието на местния Път на коприната конкретно в Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България. Работата по изпълнението на дължимия резултат ще е ориентирана спрямо основните характеристики на Уеб-ГИС хранилището на данни – тяхната архитектура и изисквания за съдържание, разработени от гръцкия партньор.

Доклад за резултат D.T3.1.3, който да отразява подпомагането на процеса на синхронизацията на Уеб-карта, Уеб-услуги и Управленска система за свързаност на данни (RDMS) в Уеб-ГИС платформата посредством следване правилата на Отворения геопространствен консорциум (Open Geospatial Consortium). От наша страна като изпълнител ще предложим методика за адекватно изпълнение на: географски параметри; предварително зададени пространствени и атрибутивни заявки; поддръжка на базовата карта и символи; интерактивно съдържание; легенда и други интерактивни функции, които ще бъдат обект на постоянен мониторинг от страна на гръцкия партньор.

Доклад за резултат D.T3.1.4., който ще отразява работата за подпомагане на процеса на въвеждане (качване) съдържанието на данните в Уеб-платформата. За целта ще бъде сформирана работна група, одобрена от възложителя, с чиято работа ще гарантираме качествено въвеждане на съдържанието на данните в съответния информационно – технически формат (doc, pdf, jpeg, jpg, data (xls)...) .

Доклад за резултат D.T3.1.5 „Съдействие за изготвяне на видео (документален филм) за разказване на истории и споделяне на опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“.

В качеството си на изпълнител ще окажем съдействие на гръцкия партньор по проекта за изготвяне на видео (документален филм) за разказване на истории и споделяне на опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури по Пътя на коприната.

Изпълнението ще включва действия за документиране на различните направления, лични разкази и истории относно етнографското минало и настоящите местни общности по Пътя на коприната. Спрямо представителите на местните общности ще се използват и прилагат съвременни и различни начини за записване, изразяване и представяне на разказите от миналото и настоящето. Друга форма на включване и записване на общностите ще бъде споделянето на различните истории и на техния културен опит относно Пътя на коприната.

Обменът на най-добри практики и интегриране на общностите по Пътя на коприната ще доведе не само до знания за споделяне и изграждане на документален филм, но и до съвместни действия за споделяне на идеи, за представяне и записване на различни истории или насърчаване за участие в различните направления, създавайки по този начин уеб-платформата на виртуалната обсерватория по Пътя на коприната.



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture




Доклад за резултат D.T3.1.6 „Съдействие за управление на данни на видео (документален филм) за разказване на истории и опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“

Специфичната цел на резултата ще е свързана с изграждането и поддържането на социална платформа, даваща възможност на всички заинтересовани страни да участват активно, което ще позволи по-добро разбиране на културния и туристически ефект от местните култури на Западния път на коприна и споделяне на техните знания и ежедневен опит помежду им.

За целите на доклада ще се разработи и предложи нова форма за събиране на туристическия опит по темата за културното наследство на Пътя на коприната, която ще служи като инструмент за нови бизнес възможности. Видеофилмът или документалният филм за извършената работа с местните общности ще бъдат качени в уеб платформата на обсерваторията, разработени от гръцкия партньор.

2. Последователност на планираните дейности

Изпълнението на основна дейност А.Т.3.1. „Създаване на Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ от поръчката ще се реализира в седем основни етапа, обвързани в логическа последователност. Всеки от етапите ще включва конкретни дейности и поддейности, които ще осигурят постигането на съответните цели и задачи от предмета на поръчката. Логическата последователност на етапите е показано на фигура 1.1.

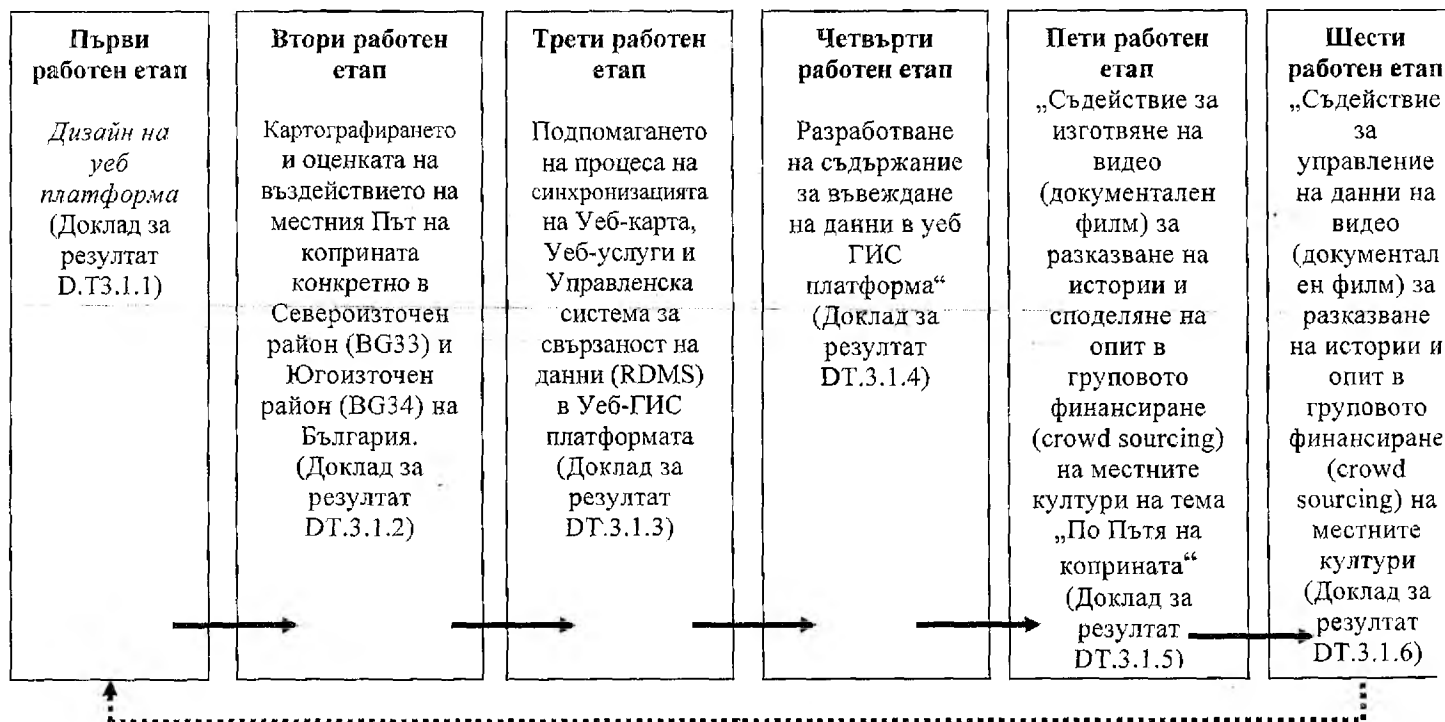

Предаване на окончателен доклад за изпълнение на дейност А.Т.3.1

Фиг. 1.1 Логическа схема на изпълнение на Дейност А.Т.3.1 от поръчката

3. План-график на изпълнението на поръчката по техническа спецификация за изпълнение на Основна дейност А.Т.3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“

Предлагаме срокове за изпълнение на поръчката по спецификацията както следва.

- Първо, предаване на тематичен доклад **D.T3.1.1** „Дизайн на уеб платформа“; на български и английски език в срок до 31.07.2020г.
- Второ, предаване на тематичен доклад **D.T3.1.2** „Съдействие за изграждане и изпълнение на уеб ГИС (географска информационна система)“; на български език и английски език в срок до 31.08.2020г.
- Трето, предаване на тематичен доклад **D.T3.1.3** „Съдействие при разработването и мониторинг на уеб ГИС“ на български език и английски език в срок до 05.02.2021г.
- Четвърто, предаване на тематичен доклад **D.T3.1.4** „Разработване на съдържание за въвеждане на данни в уеб ГИС платформа“ на български език и английски език в срок до 05.02.2021г.
- Пето, предаване на тематичен доклад **D.T3.1.5** „Съдействие за изготвяне на видео (документален филм) за разказване на истории и споделяне на опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“ на български език и английски език в срок до 31.01.2021г.
- Шесто, предаване на тематичен доклад **D.T3.1.6** „Съдействие за управление на данни на видео (документален филм) за разказване на истории и опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“ на български език и английски език в срок до 31.10.2020г.
- Седмо, предаване на окончателен доклад за изпълнение на Основна дейност А.Т.3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ на български език и английски в срок до 26.02.2021г.

Подобен **индикативен** график на реализиране на основните дейности, поддейности и резултати по тях е представен в **таблица 1.1**

Таблица 1.1

ГРАФИК

за изпълнение на Дейност А.Т.3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“

N:	ДЕЙНОСТИ и РЕЗУЛТАТИ	Срок на изпълнение
1	ДЕЙНОСТ А.Т. 3.1.1. „Дизайн на уеб платформа“	1.07.2020-31.07.2020
1.1	Разработване и реализиране на методика за организирането на входящите данни от страните партньори и в частност от дестинация България	1.07.2020-31.7.2020
1.2	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T3.1.1 <i>Дизайн на уеб платформа</i> на български и на английски език на хартиен и електронен носител	31.07.2020



Project funded by
EUROPEAN UNION



Slik Road Local Culture



2	ДЕЙНОСТ 3.1.2. „Съдействие за изграждане и изпълнение на уеб ГИС (географска информационна система)”	1.08.2020-31.08.2020
2.1	Извеждане на основните характеристики на Уеб-ГИС хранилището на данни – тяхната архитектура и изисквания за съдържание	1.08.2020-31.08.2020
2.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат 3.1.2. „Съдействие за изграждане и изпълнение на уеб ГИС (географска информационна система)“; на български и на английски език на хартиен и електронен носител	31.08.2020
3.	ДЕЙНОСТ 3.1.3. „Съдействие при разработването и мониторинг на уеб ГИС“;	1.07.2020-05.02.2021
3.1.	Разработване и реализиране на методика за адекватно изпълнение на: географски параметри; предварително зададени пространствени и атрибутивни заявки; поддръжка на базовата карта и символи; интерактивно съдържание; легенда и други интерактивни функции	1.07.2020-05.02.2021
3.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат 3.1.3. „Съдействие при разработването и мониторинг на уеб ГИС“; на български и на английски език на хартиен и електронен носител	05.02.2021
4	ДЕЙНОСТ D.T3.1.4 „Разработване на съдържание за въвеждане на данни в уеб ГИС платформа“;	1.07.2020-05.02.2021
4.1.	Представяне на предложения за формиране на работна група и гарантиране на качествено въвеждане на съдържанието на данните в съответния информационно – технически формат	1.07.2020-05.02.2021
4.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T3.1.4 „Разработване на съдържание за въвеждане на данни в уеб ГИС платформа“, на български и на английски език на хартиен и електронен носител	05.02.2021
5.	ДЕЙНОСТ D.T3.1.5 „Съдействие за изготвяне на видео (документален филм) за разказване на истории и споделяне на опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“;	1.07.2020-31.01.2021
5.1.	Действия за документиране на различните направления, лични разкази и истории относно етнографското минало и настоящите местни общности по Пътя на коприната.	1.07.2020-05.02.2021
5.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T3.1.5 „Съдействие за изготвяне на видео (документален филм) за разказване на истории и споделяне на опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“, на български и на английски език на хартиен и електронен носител	31.01.2021
6.	ДЕЙНОСТ D.T3.1.6 „Съдействие за управление на данни на видео (документален филм) за разказване на истории и опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“	1.07.2020-31.10.2020
6.1.	Изграждането и поддържането на социална платформа, което ще	1.07.2020-

	позволи по-добро разбиране на културния и туристически ефект от местните култури на Западния път на коприна и споделяне на техните знания и ежедневен опит помежду им.	31.10.2020
6.2.	Представяне на окончателен D.T3.1.6 „Съдействие за управление на данни на видео (документален филм) за разказване на истории и опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“, на български и на английски език на хартиен и електронен носител	31.10.2020
7	Представяне на предварителен доклад за изпълнение на Дейност A.T3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ на български език на хартиен и електронен носител	12.02.2021
7.1	Представяне на бележки на възложителя	19.02.2021
7.2	Представяне на окончателен доклад за изпълнение на Дейност A.T3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ на български и на английски език на хартиен и електронен носител	26.02.2021

II. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1. Разпределение на наличния ресурс (човешки и технически) и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в изпълнението на всяка една от дейностите

„ФИЛ“ ООД разполага с необходимите технически и кадрови ресурси за качествено изпълнение на поръчката с предмет „ВИРТУАЛНА ОБСЕРВАТОРИЯ НА ПЪТЯ НА КОПРИНАТА“. Фирмата е осигурила необходимите ключови експерти в съответствие с характера на планираните за реализация дейности (*виж списък на екипа ключови експерти*)

СПИСЪК

на екипа от ключови експерти, ангажирани за изпълнение на поръчката

За изпълнение на поръчката ФИЛ ООД разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на поръчката. Екипът включва минимум следните ключови експерти (КЕ):



1. Ключов експерт (КЕ 1) „Ръководител на екип“:

Инж. Георги Христов Филипов

Притежава образование, компетенции и професионален опит както следва:

- Висше образование, магистър по компютърни науки ТУ-Варна; професионална квалификация по корпоративен мениджмънт към НБУ-София и Open University UK; майсторско свидетелство по медийни техники и медиен дизайн към ИЗК, автор на туристическото лого на България 1999 г.

- Притежава над 25 (двадесет и пет) години общ професионален стаж и управленски опит;




Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



- Притежава над 15 (петнадесет) години опит в работа на проекти/услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

2. Ключов експерт (КЕ 2) „Маркетинг“:

Доц. д-р Веселина Иванова Атанасова

Притежава образование, компетенции и професионален опит както следва:

- Висше образование, образователно-научна степен „доктор“ и хабилитирано лице в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9 Туризм, съгласно Постановление 125 на МС от 24.06.2002 за утвърждаване на Класификатора на областите на висше образование и професионални направления

- Притежава над 3 (три) години опит в научни и приложни разработки в областта на управлението и маркетинга на туристически дестинации

- Преподавател по туризм в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

3. Ключов експерт (КЕ 3) „Маркетингови комуникации“

д-р Христина Недялкова

Притежава образование, компетенции и професионален опит както следва:

- Висше образование, образователно-научна степен „доктор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9 Туризм, съгласно Постановление 125 на МС от 24.06.2002 за утвърждаване на Класификатора на областите на висше образование и професионални направления.

- Притежава над 3 (три) години опит в областта на екскурзоводството

- Провеждала е обучение по туристически ресурси и екскурзоводство.

4. Ключов експерт (КЕ 4) „Туристически ресурси“:

Гл.ас. д-р Елена Дамянова Илиева

Притежава образование, компетенции и професионален опит както следва:

- Висше образование, образователно-научна степен „доктор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9 Туризм, съгласно Постановление 125 на МС от 24.06.2002 за утвърждаване на Класификатора на областите на висше образование и професионални направления.

- Преподавател по туризм в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

- Притежава над 3 (три) години опит в научни и приложни разработки в областта на туристическите ресурси

5. Ключов експерт (КЕ 5) „Туристически ресурси“

Валерий Гочев

Притежава образование, компетенции и професионален опит както следва:

- Висше образование, образователно-научна степен „магистър“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9 Туризм, съгласно Постановление 125 на МС от 24.06.2002 за утвърждаване на Класификатора на областите на висше образование и професионални направления.

- Притежава над 3 (три) години опит в практикуването и преподаването на туризм и екскурзоводство



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



Изпълнителят ще използва и други експерти, които по негова преценка са необходими за своевременно и качествено изпълнение на обществената поръчка.

Разпределението на участието на ключовите експерти по дейности в рамките на изпълнението на Дейност А.Т.3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ е показано в таблица 1.2.

Таблица 1.2

Разпределение на участието на ключовите експерти в изпълнението на Дейност А.Т.3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“

N:	ДЕЙНОСТИ, ПОДДЕЙНОСТИ, РЕЗУЛТАТИ	Участие на ключовите експерти				
		KE1	KE2	KE3	KE4	KE5
1	ДЕЙНОСТ А.Т. 3.1.1. Дизайн на уеб платформа					
1.1	Разработване на методика за организирането на входящите данни от страните партньори и в частност от дестинация България	X	X	X	X	X
1.2	Представяне на окончателен Доклад за резултат Д.Т3.1.1 Дизайн на уеб платформа на български и на английски език на хартиен и електронен носител	X				
2	ДЕЙНОСТ 3.1.2. „Съдействие за изграждане и изпълнение на уеб ГИС (географска информационна система)“;					
2.1	Извеждане на основните характеристики на Уеб-ГИС хранилището на данни – тяхната архитектура и изисквания за съдържание	X	X	X	X	X
2.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат 3.1.2. „Съдействие за изграждане и изпълнение на уеб ГИС (географска информационна система)“;на български и на английски език на хартиен и електронен носител	X				
3.	ДЕЙНОСТ 3.1.3. „Съдействие при разработването и мониторинг на уеб ГИС“;					
3.1.	Разработване на методика за адекватно изпълнение на: географски параметри; предварително зададени пространствени и атрибутивни заявки; поддръжка на базовата карта и символи; интерактивно съдържание; легенда и други интерактивни функции	X	X	X	X	X
3.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат 3.1.3. „Съдействие при разработването и мониторинг на уеб ГИС“;	X				



Project funded by
EUROPEAN UNION



Slik Road Local Culture



4	ДЕЙНОСТ D.T3.1.4 „Разработване на съдържание за въвеждане на данни в уеб ГИС платформа“;					
4.1.	Представяне на предложения за формиране на работна група и гарантиране на качествено въвеждане на съдържанието на данните в съответния информационно – технически формат	X	X	X	X	X
4.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T3.1.4 „Разработване на съдържание за въвеждане на данни в уеб ГИС платформа“;	X				
5.	ДЕЙНОСТ D.T3.1.5 „Съдействие за изготвяне на видео (документален филм) за разказване на истории и споделяне на опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“;					X
5.1.	Действия за документиране на различните направления, лични разкази и истории относно етнографското минало и настоящите местни общности по Пътя на коприната.	X	X	X	X	X
5.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T3.1.5 „Съдействие за изготвяне на видео (документален филм) за разказване на истории и споделяне на опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“;	X				
6.	ДЕЙНОСТ D.T3.1.6 „Съдействие за управление на данни на видео (документален филм) за разказване на истории и опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“					
6.1.	Изграждането и поддържането на социална платформа, което ще позволи по-добро разбиране на културния и туристически ефект от местните култури на Западния път на коприната и споделяне на техните знания и ежедневен опит помежду им.	X	X	X	X	X
6.2.	Представяне на окончателен D.T3.1.6 „Съдействие за управление на данни на видео (документален филм) за разказване на истории и опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“	X				



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



7	Представяне на предварителен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ на български език на хартиен и електронен носител	X				
7.1	Представяне на окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ на български и английски език.	X				

2. Механизъм на взаимодействие и координация между експертите

Дейностите по поръчката са с голям обем на работа, която трябва да се изпълни в определен срок. За целта ще се създаде ефективна организационно-комуникационна структура между ключовите експерти от една страна и между изпълнителя и възложителя от друга страна. С възложителя ще контактува ръководителят на екипа KE1 като своевременно ще информира всички останали ключови експерти.

Механизмът за комуникация, взаимодействие и координация между двата екипа на изпълнителя и екипа на възложителя е представен в органиграмата на **фиг. 1.2**



Фиг. 1.2. Органиграма на екипа за изпълнение на поръчката

3. Методи за гарантиране на устойчивост на резултатите

Устойчивостта на резултатите от изпълнението на поръчката се определя от възможността те да служат за цялостното изпълнение на проекта SILK и основно за:

Първо, създаване на дизайн на уеб платформа, която акцентира върху създаването на методика за организирането на входящите данни от страните партньори и в частност от дестинация България с цел постигането на изцяло съвместими решения в контекста на дизайна и архитектурата на уеб платформата при отчитане на нейните основни конструктивни елементи – ГИС, SILCNET мрежата и приложението за разпознаване на SILC местоположение.

Второ, разработване на съдържание за ГИС (географска информационна система).

Трето, разработването и мониторинг на уеб ГИС.

Четвърто, Разработване на съдържание за въвеждане на данни в уеб ГИС платформа“;

Пето, Съдействие за изготвяне на видео (документален филм) за разказване на истории и споделяне на опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“

Шесто, Съдействие за управление на данни на видео (документален филм) за разказване на истории и опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“

Устойчивост на резултатите ще се осигури на следната основа и със следните методи:

Първо, устойчивост, произтичаща от процесуално-информационното и документално гарантиране на качествено изпълнение на поръчката. „ФИЛ“ ООД има внедрени и прилага системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и 27001:2006.

Второ, устойчивост, гарантирана от използването на надеждни емпирични и аналитични методи за провеждане на планираните изследвания

Трето, устойчивост, осигурена от използването на качествени експерти с дългогодишен опит в теорията и практиката на туризма

Четвърто, устойчивост от подробното планиране, организиране, изпълнение и контрол на дейностите и операциите в съдържанието на поръчката

Пето, устойчивост на основата на публичност и прозрачност на извършваната работа чрез ангажиране на голям брой представители на всички заинтересовани страни.


Шесто, устойчивост на основата на мащабна комуникация на постигнатите резултати чрез научни доклади и перманентна информация в средствата за масова информация и в социалните мрежи.

III. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1. Основни потенциални рискове за изпълняваните дейности;

Рискът е нестабилно състояние или несигурно събитие, което ако се случи ще окаже влияние върху поне един аспект на проекта. Под риск на реален проект (проектен риск) се разбира случайно събитие, което с появата си въздейства (негативно или позитивно) върху поне един от показателите на проекта – срок, стойност и съдържание (качество) и време.

В контекста на предмета на настоящата поръчка, възприемаме следните класификации на риска.





Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



Първо, според категорията рисковете могат да бъдат класифицирани като:

- **правно-регулаторни** – възникващи в резултат на промяна в нормативната среда;

- **рискове на дейността по създаване на продукта** – засягат възможностите за създаване и качеството на създавания продукт.

- **организационно-управленски рискове** – засягат организацията, разработваща проекта

- Второ, според възможността да бъдат предвидени рисковете биват:

- **очаквани** – такива, които биха могли да бъдат открити при внимателен анализ;

- **предвидими** – рискове, които се предвиждат на базата на предишен опит;

- **непредвидими** – рискове, които е трудно да бъдат предвидени;

- Трето, според обхвата си рисковете могат да бъдат:

- **общи** – възможни за всеки проект;

- **специфични** – типични за разработвания продукт;

За качествен и количествен анализ на възможните рискове – оценка на вероятността за сбъждане и въздействието на всеки един риск приемаме следните скали:

- 3-степенна скала за вероятност за сбъждане на риска: 1- малка, 2-средна, 3-голяма

- 3-степенна скала за сила на въздействие на риска: 1-слабо, 2-средно, 3-силно.

Рейтингът на всеки идентифициран риск ще се изчислява по следната формула:

■ **Рейтинг = Степен на вероятност * Сила на въздействие**

- Според получения рейтинг класифицираме рисковете както следва:

- Нисък рейтинг – от 1 до 3

- Среден рейтинг – от 4 до 6

- Висок рейтинг – над 7

Възприетите класификации и скали за оценка на риска са необходими за изготвянето на **таблица на риска**. В нея рисковете се описват по проектни дейности, категории, вероятност на възникване, сила на въздействието, рейтинг, реакция и план за действие.

2. План за управление на риска

Изработването на стратегия и план за управление на риска при изпълнение на настоящата поръчка се основава на концепцията за цикъла на управление на риска. Според този цикъл управлението на риска в проекта (проектен риск) включва процеси, отнасящи се към: планиране на управлението на риска; идентифициране; анализ и оценка на проектните рискове; действия в отговор на тяхното възникване и наблюдение. Целта на управлението е повишаване вероятността за възникване на благоприятни събития и минимизиране на вероятността за възникване и въздействието на неблагоприятните. Процесите по управление на риска включват:

Първо, планиране управлението на риска – избор на подход, планиране и изпълнение на операции по управление на проектните рискове;

Второ, идентификация на рисковете – определяне на това какви рискове е възможно да възникнат и какви са техните характеристики;

Трето, качествен анализ на проектните рискове – разполагане на рисковете по приоритет, вероятност за възникване и степен на въздействие;

Четвърто, количествен анализ на проектните рискове – количествена оценка на влиянието на проектните рискове върху общите цели на проекта;

Пето, планиране на действия в отговор на възникване на рисковите събития – разработване на различни варианти и действия за повишаване на благоприятното въздействие и намаляване на заплахите за постигането целите на проекта;

Шесто, наблюдение и управление на рисковете – следене на идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчните рискове, идентифициране на нови рискове, изпълнение на планове в отговор на рисковете и оценка на ефективността през жизнения цикъл на проекта.

За нуждите на изпълнението на настоящата поръчка предлагаме използването на следните 3 стратегии за управление на риска:

- **избягване на риска** – стратегия, при която се намалява вероятността от събъждане на риска;
- **минимизиране на ефекта** при събъждане на риска – стратегия, при която се намаляват последствията от събъждането на риска;
- **планове за извънредни действия** – стратегия, при която приемаме риска и е предвиждаме мерки за справяне с него, ако той се събдне;

3. Риск регистър: мерки за предотвратяване или преодоляване на рисковете за всяка от дейностите

Предлагаме вариант на риск-регистър при изпълнението на **Основна дейност А.Т.3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“**

Риск-регистърът представя идентифицираните рискове във връзка с всяка една от дейностите по изпълнението на поръчката. В **таблица 1.3** са описани категориите, в които попадат рисковете по дейности, оценки за вероятност за възникване и влияние върху изпълнението, рейтинг на риска, реакция, планирани мерки за предотвратяване или прекратяване на риска.

Таблица 1.3

РИСК-РЕГИСТЪР

на осъществяването на Дейност **А.Т.3.1 Дейност „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“** от обществена поръчка с предмет: **“Виртуална обсерватория по Пътя на коприната“** по проект **„Местната култура по Пътя на коприната“ / “SILC Road local culture”**

N	ДЕЙНОСТИ и РЕЗУЛТАТИ	Риск	Вероятност от 1 до 3	Въздействие от 1 до 3	Рейтинг от 1 до 9	Реакция	Планови мерки за управление
1	ДЕЙНОСТ А.Т. 3.1.1. Дизайн на уеб платформа						
1.1	Създаване на методика за организирането на входящите данни от	Трудности при откриване на всички	1	1	1	Избягване	Изчерпателно търсене на информация на



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



	страните партньори и в частност от дестинация България	реализирани дейности					всички равнища и от всички възможни източници
		Нежелание за съдействие от страна на част от заинтересованите страни	3	3	7	Минимизиране	Интензивна комуникация със съгласилите се за участие в мрежата
		Липсата на изчерпателна информация за определени заинтересовани страни	2	3	5	Минимизиране	Търсене на допълнителна косвена информация
		Неефективна комуникация с гръцкия партньор като изпълнител на общата база данни	1	3	3	Избягване	Съдействие от ИУ-Варна за комуникация с чуждестранните партньори
1.2	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.ТЗ.1.1 Дизайн на уеб платформа на български и на английски език на хартиен и електронен носител	Неефективна комуникация между Възложителя и изпълнителя относно съдържанието на доклада	1	3	3	Избягване	Фиксиране на дати и часове на работни срещи Ефективна комуникация с посочени срокове
		Забавяне на бележките от Възложителя	1	3	3	Избягване	Постоянна комуникация с възложителя за оказване на съдействие при затруднения
		Кратък срок за изготвяне на доклада	2	3	6	Избягване	Стриктен контрол от ръководителя на екипа за срочно изпълнение на задачите
2	ДЕЙНОСТ 3.1.2. „Съдействие за изграждане и изпълнение на уеб ГИС (географска информационна система)“;	Липсата на изчерпателна информация относно изграждането на ГИС	2	3	5	Минимизиране	Търсене и попълване с липсваща информация
2.1.	Извеждане на основните характеристики на Уеб-ГИС хранилището на данни – тяхната архитектура и изисквания за съдържание	Неефективна комуникация с гръцкия партньор като изпълнител на общата база данни	1	3	3	Избягване	Съдействие от ИУ-Варна за комуникация с чуждестранните партньори
2.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат 3.1.2. „Съдействие за изграждане	Неефективна комуникация между	1	3	3	Избягване	Фиксиране на точни дати и часове на работни



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



	и изпълнение на уеб ГИС (географска информационна система)“; на български и на английски език на хартиен и електронен носител	Възложителя и изпълнителя					срещи Ефективна комуникация с посочени срокове
		Забавяне на бележките от Възложителя	1	3	3	Избягване	Постоянна комуникация с възложителя за оказване на съдействие при затруднения
		Кратък срок за изготвяне на доклада	2	3	6	Избягване	Стриктен контрол от ръководителя на екипа за срочно изпълнение на задачите
3.	ДЕЙНОСТ 3.1.3. „Съдействие при разработването и мониторинг на уеб ГИС“;	Липсата на изчерпателна информация относно изграждането на ГИС	2	3	5	Минимизиране	Търсене и попълване с липсваща информация
3.1.	Разработване на методика за адекватно изпълнение на: географски параметри; предварително зададени пространствени и атрибутивни заявки; поддръжка на базовата карта и символи; интерактивно съдържание; легенда и други интерактивни функции	Липсата на изчерпателна информация относно методиката	2	3	5	Минимизиране	Търсене и попълване с липсваща информация
3.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат 3.1.3. „Съдействие при разработването и мониторинг на уеб ГИС“;	Кратък срок за изготвяне на доклада	2	3	6	Избягване	Стриктен контрол от ръководителя на екипа за срочно изпълнение на задачите
4	ДЕЙНОСТ D.T3.1.4 „Разработване на съдържание за въвеждане на данни в уеб ГИС платформа“;	Неефективна комуникация с гръцкия партньор като изпълнител на общата база данни	1	3	3	Избягване	Съдействие от ИУ-Варна за комуникация с чуждестранните партньори
4.1.	Представяне на предложения за формиране на работна група и гарантиране на качествено въвеждане на съдържанието на данните в съответния информационно – технически формат	Неефективна комуникация между Възложителя и изпълнителя	1	3	3	Избягване	Фиксиране на точни дати и часове на работни срещи Ефективна комуникация с посочени срокове
4.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T3.1.4 „Разработване на съдържание за въвеждане	Забавяне на бележките от Възложителя	1	3	3	Избягване	Постоянна комуникация с възложителя за оказване на



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



	на данни в уеб ГИС платформа“;						съдействие при затруднения
5.	ДЕЙНОСТ D.T3.1.5 „Съдействие за изготвяне на видео (документален филм) за разказване на истории и споделяне на опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“;	Трудности при откриване на всички реализирани дейности	1	1	1	Избягване	Изчерпателно търсене на информация на всички равнища и от всички възможни източници
5.1.	Действия за документиране на различните направления, лични разкази и истории относно етнографското минало и настоящите местни общности по Пътя на коприната.	Нежелание за съдействие от страна на част от заинтересованите страни	3	3	7	Минимизиране	Интензивна комуникация със съгласилите се за участие в мрежата
5.2.	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T3.1.5 „Съдействие за изготвяне на видео (документален филм) за разказване на истории и споделяне на опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“;	Неефективна комуникация между Възложителя и изпълнителя	1	3	3	Избягване	Фиксиране на точни дати и часове на работни срещи Ефективна комуникация с посочени срокове
6.	ДЕЙНОСТ D.T3.1.6 „Съдействие за управление на данни на видео (документален филм) за разказване на истории и опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“	Трудности при откриване на всички реализирани дейности	1	1	1	Избягване	Изчерпателно търсене на информация на всички равнища и от всички възможни източници
6.1.	Изграждането и поддържането на социална платформа, което ще позволи по-добро разбиране на културния и туристически ефект от местните култури на Западния път на коприната и споделяне на техните знания и ежедневен опит помежду им.	Нежелание за съдействие от страна на част от заинтересованите страни	3	3	7	Минимизиране	Интензивна комуникация със съгласилите се за участие в мрежата
6.2.	Представяне на окончателен D.T3.1.6 „Съдействие за управление на данни на видео (документален филм)	Неефективна комуникация между Възложителя и	1	3	3	Избягване	Фиксиране на точни дати и часове на работни срещи



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



	за разказване на истории и опит в груповото финансиране (crowd sourcing) на местните култури на тема „По Пътя на коприната“	изпълнителя					Ефективна комуникация с посочени срокове
7	Представяне на предварителен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ на български език на хартиен и електронен носител	Кратък срок за изготвяне на доклада	2	3	6	Избягване	Стриктен контрол от ръководителя на екипа за срочно изпълнение на задачите
7.1	Представяне на окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“ на български и английски език.	Забавяне на бележките от Възложителя	1	3	3	Избягване	Постоянна комуникация с възложителя за оказване на съдействие при затруднения
		Кратък срок за изготвяне на доклада	2	3	6	Избягване	Стриктен контрол от ръководителя на екипа за срочно изпълнение на задачите



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



2. Съгласно ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ в изготвянето на доклад „Създаване на съвместна маркетингова стратегия“ за изпълнение на Дейност А.Т.3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ се включват следните основни части:

1. ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. Описание на планираните дейности, целите, очаквани резултати и методи за постигане на резултатите

Задачата на Окончателния доклад „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ за изпълнение на Дейност А.Т.3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ е комуникацията между членовете на мрежата SILCNET да бъде улеснена от по-широка уеб-базирана система, интегрирана във Визуалната платформа на обсерваторията.

Окончателният доклад за изпълнение на Дейност А.Т.3.2. „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ ще съдържа един документиран резултат: Доклад за резултат D.Т3.2.1 „Съдействие за функционирането на местна подсистема за комуникация на SILCNET LABEL на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“.

Докладът за резултат D.Т3.2.1 „Съдействие за функционирането на местна подсистема за комуникация на SILCNET LABEL на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“, ще се изразява в оказано експертно и информационно съдействие за стартиране и действие на местна подсистема за комуникация на SILCNET LABEL на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“, която ще функционира на основата на две дискретни уеб-базирани интегрирани подсистеми във виртуалната платформа на обсерваторията. Основната им цел ще е да улеснят комуникацията и нуждите от консултации на членовете на SILCNET мрежата. Дизайнът на отделните подсистеми ще позволява и предвиди публикуването на документи, възможности за онлайн консултации и обратна връзка на участниците.

Структурата на мрежата SILCNET ще да бъде разделена на две ядра:

Първо ядро – основна транснационална мрежа, ще се състои от всички представители на партньорите, ключови местни участници и представители на бизнеса, ангажирани в туризма и културата.

Второ ядро - пет големи регионални мрежи, работещи на местно ниво, ще се състои от предприемачи в областта на Пътя на коприната и туризма. Всеки партньор ще управлява и координира собствената си локална мрежа, но също така ще се развива съвместно в рамките на основната по-широка транснационална мрежа чрез предоставяне на обратна връзка на другите партньори. Поради сложността в комуникацията между предложените мрежи, отделните подсистеми, интегрирани в платформата на Виртуалната обсерватория ще отговарят за протичане на ефективен комуникационен процес.

За двата типа мрежи ще бъдат разработени различни „входове“ за достъп, за да могат всички членове на мрежата да взаимодействат чрез собствена платформа. Освен това, ще бъдат проведени общи консултации за всички членове на SILCNET, с оглед улесняване на комуникацията по въпроси, възникващи по време на изпълнението на



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



проектите.

Всяка мрежова подсистема ще публикува документи и получава обратна информация. Чрез модела на комуникация на он-лайн подсистемите, членовете на SILCNET ще могат да се възползват от следните основни предимства:

- Поради транснационалния характер на проекта и липсата на географска близост, предлаганият модел за комуникация ще улеснява връзката между членовете на SILCNET.

- Регионалната интеграция, постигната от местните подмрежи, ще генерира бизнес възможности за развитие на клъстери в туристическия сектор.


- Онлайн опциите за обратна връзка от общността на SILCNET се увеличават.

- За разлика от незаписаните словесни разговори, онлайн дискусиите са трайни и ще могат да бъдат преразгледани и преосмислени.

- Онлайн дискусиата ще предоставя удобна среда за опит и добри практики.

2. Последователност на планираните дейности

Изпълнението на основна дейност А.Т.3.2 **„Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“** от поръчката ще се реализира в три основни етапа, обвързани в логическа последователност. Всеки от етапите ще включва конкретни дейности, които ще осигурят постигането на съответните цели и задачи от предмета на поръчката. Логическата последователност на етапите е показано на **фигура 2.1**.

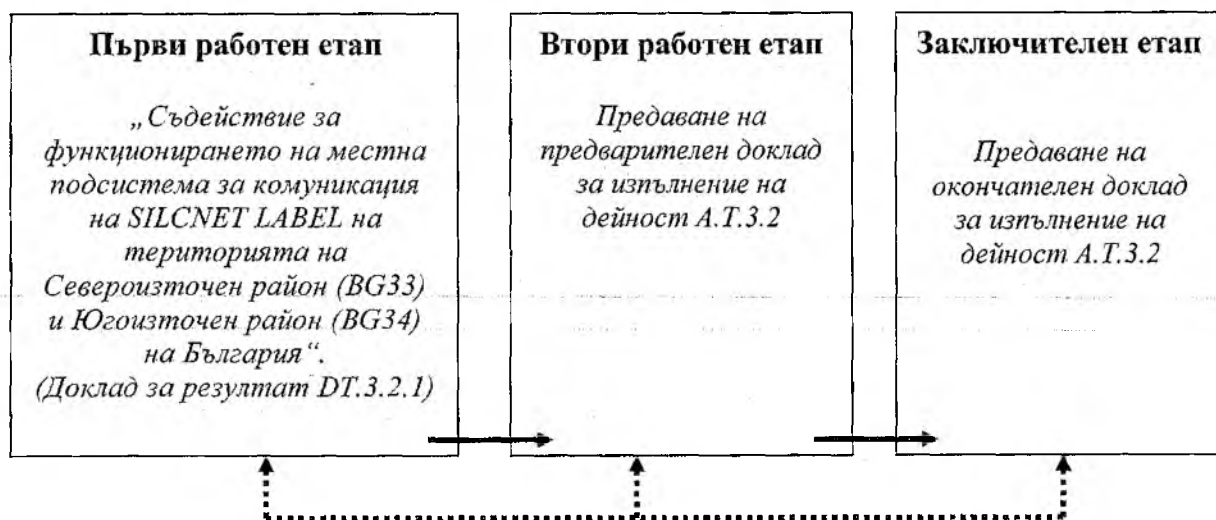

Фиг. 2.1 Логическа схема на изпълнение на Дейност А.Т.3.2 от поръчката

3. План-график на изпълнението на поръчката по техническа спецификация за изпълнение на Основна дейност А.Т.3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“

Предлагаме срокове за изпълнение на поръчката по спецификацията както следва.

Първо, предаване на Доклад за резултат DT.3.2.1 „Съдействие за функционирането на местна подсистема за комуникация на SILCNET LABEL на



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“ на български и английски език в срок до 17.07.2020г.

Второ, предаване на **предварителен доклад** за изпълнение на Основна дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ на български език в срок до 17.07. 2020г

Трето, предаване на **Окончателен доклад** за изпълнение на Основна дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ на български език и английски в срок до 31.07. 2020г.

Подробен индикативен график на реализиране на основните дейности, поддейности и резултати по тях е представен в **таблица 2.1**

Таблица 2.1

ГРАФИК

за изпълнение на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“

№:	ДЕЙНОСТИ и РЕЗУЛТАТИ	Срок на изпълнение
1	ДЕЙНОСТ А.Т. 3.2.1. „Съдействие за функционирането на местна подсистема за комуникация на SILCNET LABEL на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“ на български и английски език.	1.07.2020-31.07.2020
1.1	Представяне на Доклад за резултат ДТ.2.3.1 „Съдействие за функционирането на местна подсистема за комуникация на SILCNET LABEL на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“ на български език на хартиен и електронен носител	17.07.2020
1.2	Представяне на предварителен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ на български и на английски език на хартиен и електронен носител	17.07.2020
	Представяне на забележки от Възложителя	24.07.2020
2	Представяне на окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ на български и на английски език на хартиен и електронен носител	31.07.2020

II. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1. Разпределение на наличния ресурс (човешки и технически) и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в изпълнението на всяка една от дейностите

ФИЛ“ ООД разполага с необходимите технически и кадрови ресурси за качествено изпълнение на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ от обществената поръчка с предмет “Виртуална обсерватория по Пътя на коприната“ Фирмата е осигурила необходимите ключови експерти в съответствие с характера на



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



планираните за реализация дейности. Списъкът на екипа от ключови експерти (KE), ангажирани за изпълнение на поръчката е представен в предложението по първата спецификация в т.1. от настоящата оферта. (виж списък на екипа ключови експерти в т.1).

Изпълнителят ще използва и други експерти, които по негова преценка са необходими за своевременно и качествено изпълнение на обществената поръчка.

Разпределение на участието на ключовите експерти по дейности в рамките на изпълнението на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ от обществена поръчка с предмет: „Виртуална обсерватория по Пътя на коприната“ е представено в таблица 2.2.

Таблица 2.2

Разпределение на участието на ключовите експерти в изпълнението на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“

N:	ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ	Участие на ключовите експерти				
		KE1	KE2	KE3	KE4	KE5
1	ДЕЙНОСТ А.Т. 3.2.1. „Съдействие за функционирането на местна подсистема за комуникация на SILCNET LABEL на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“ на български и английски език.	X	X	X	X	X
1.1	Представяне на Доклад за резултат ДТ.2.3.1 „Съдействие за функционирането на местна подсистема за комуникация на SILCNET LABEL на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“ на български език на хартиен и електронен носител	X				
1.2	Представяне на <i>предварителен</i> Доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ на български език на хартиен и електронен носител	X				
2	Представяне на окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ на български и английски език на хартиен и електронен носител	X				

2. Механизъм на взаимодействие и координация между експертите

Дейностите по поръчката са с голям обем на работа, която трябва да се изпълни в определен срок. За целта ще се създаде ефективна организационно-комуникационна структура между ключовите експерти от една страна и между изпълнителя и възложителя



Project funded by
EUROPEAN UNION




Silk Road Local Culture



от друга страна. С възложителя ще контактува ръководителят на екипа KE1 като своевременно ще информира всички останали ключови експерти.

Механизмът за комуникация, взаимодействие и координация между двата екипа на изпълнителя и екипа на възложителя е представен в органиграмата на **фиг. 2.2**

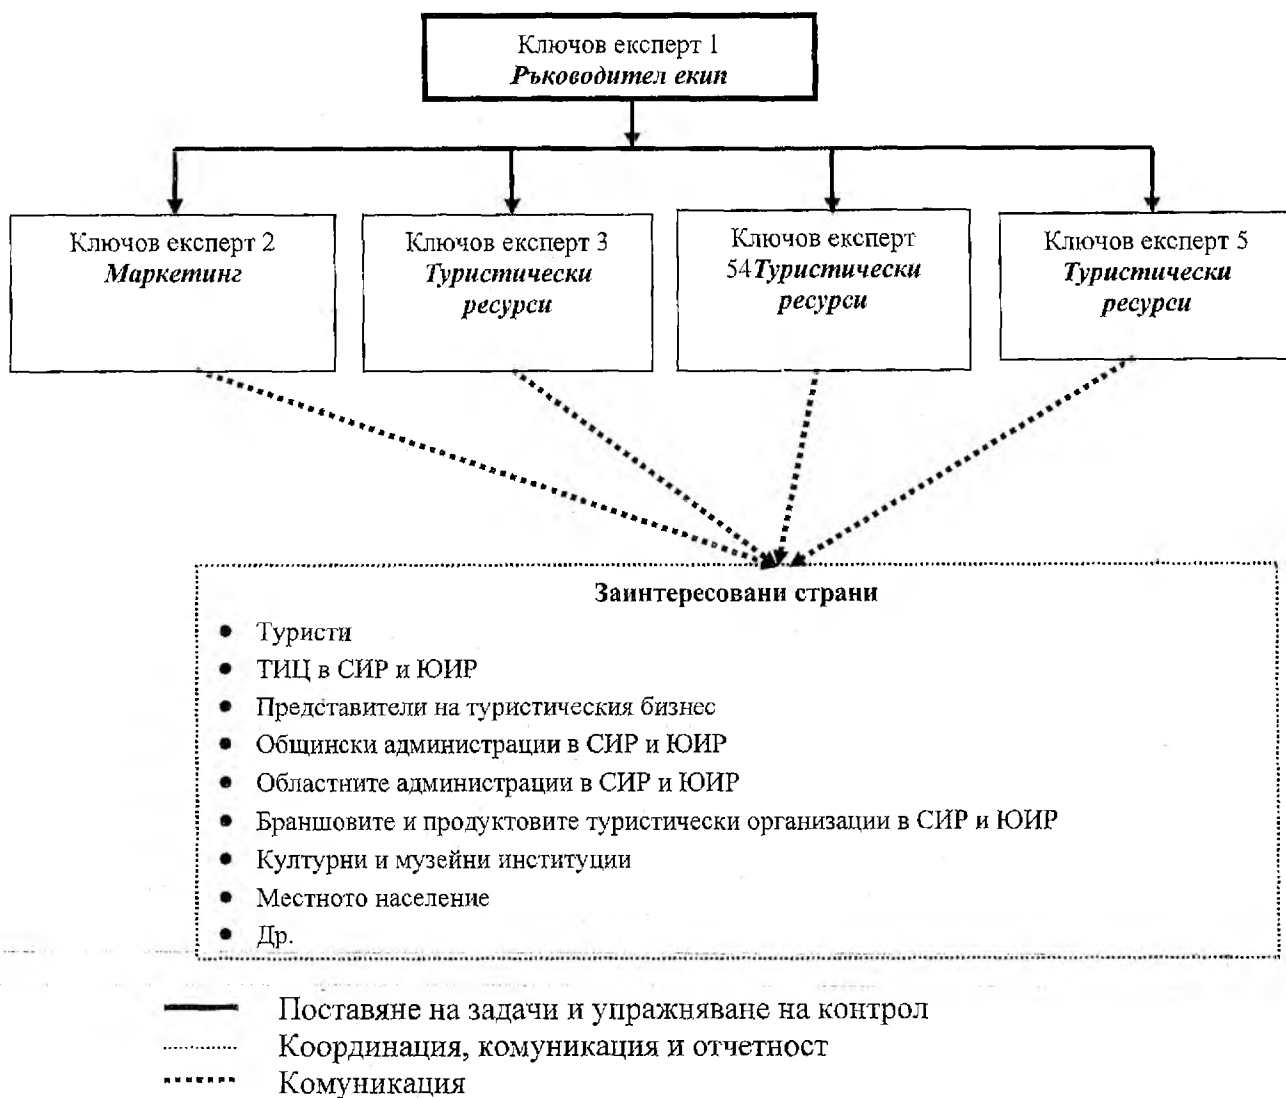

Фиг 2.2. Органиграма на екипа за изпълнение на поръчката

3. Методи за гарантиране на устойчивост на резултатите

Устойчивостта на резултатите от изпълнението на поръчката се определя от възможността те да служат за цялостното изпълнение на проекта SILK и основно за:

Първо, създаване на местна подсистема за комуникация на SILCNET LABEL на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България на български и английски език.

Второ, улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата.

Трето, създаване на виртуална обсерватория.



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



Устойчивост на резултатите ще се осигури на следната основа и със следните методи:

Първо, устойчивост, произтичаща от процесуално-информационното и документално гарантиране на качествено изпълнение на поръчката. „ФИЛ“ ООД има внедрени и прилага системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и 27001:2006.

Второ, устойчивост, гарантирана от използването на надеждни емпирични и аналитични методи за провеждане на планираните изследвания

Трето, устойчивост, осигурена от използването на качествени експерти с дългогодишен опит в теорията и практиката на туризма

Четвърто, устойчивост от подробното планиране, организиране, изпълнение и контрол на дейностите и операциите в съдържанието на поръчката

Пето, устойчивост на основата на публичност и прозрачност на извършваната работа чрез ангажиране на голям брой представители на всички заинтересовани страни.

Шесто, устойчивост на основата на мащабна комуникация на постигнатите резултати чрез научни доклади и перманентна информация в средствата за масова информация и в социалните мрежи.

III. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1. Основни потенциални рискове за изпълняваните дейности.

Дефиниция на риска, класификацията на категориите рискове, скалите за оценка на вероятността за сбъждане и въздействието на всеки един риск, както и начинът за изчисляване на рейтинга на всеки идентифициран риск са представени в предложението по спецификацията в т.1.

2. План за Управление на риска

Стратегията и планът за управление на риска при изпълнение на настоящата дейност са идентични като методология на описаните в предложението по първата спецификацията в т.1 на настоящата оферта. Процесите по управление на риска включват:

Първо, планиране управлението на риска – избор на подход, планиране и изпълнение на операции по управление на проектните рискове;

Второ, идентификация на рисковете – определяне на това какви рискове е възможно да възникнат и какви са техните характеристики;

Трето, качествен анализ на проектните рискове – разполагане на рисковете по приоритет, вероятност за възникване и степен на въздействие;

Четвърто, количествен анализ на проектните рискове – количествена оценка на влиянието на проектните рискове върху общите цели на проекта;

Пето, планиране на действия в отговор на възникване на рисковите събития – разработване на различни варианти и действия за повишаване на благоприятното въздействие и намаляване на заплахите за постигането целите на проекта;

Шесто, наблюдение и управление на рисковете – слеене на идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчните рискове, идентифициране на нови рискове, изпълнение на планове в отговор на рисковете и оценка на ефективността през жизнения цикъл на проекта.

За нуждите на изпълнението на настоящата поръчка предлагаме използването на следните 3 стратегии за управление на риска;



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



- **избягване на риска** – стратегия, при която се намалява вероятността от сбъждане на риска;
- **минимизиране на ефекта** при сбъждане на риска – стратегия, при която се намаляват последствията от сбъждането на риска;
- **планове за извънредни действия** – стратегия, при която приемаме риска и е предвиждаме мерки за справяне с него, ако той се сбъдне;

3. Риск регистър: мерки за предотвратяване или преодоляване на рисковете за всяка от дейностите

Предлагаме вариант на риск-регистър при изпълнението на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ от обществена поръчка с предмет: „Предприемаческа мрежа по Пътя на коприната“ както следва в **таблица 2.3**. В таблицата са описани категориите в които попадат рисковете по дейности, оценки за вероятност за възникване и влияние върху изпълнението, рейтинг на риска, реакция, планирани мерки за предотвратяване или прекратяване на риска.

Таблица 2.3

РИСК-РЕГИСТЪР

на осъществяването на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ от обществена поръчка с предмет: „Виртуална обсерватория по Пътя на коприната“ по проект „Местната култура по Пътя на коприната“ / “SILC Road local culture”

N	ДЕЙНОСТИ и РЕЗУЛТАТИ	Риск	Вероятност от 1 до 3	Въздействие от 1 до 3	Рейтинг от 1 до 9	Реакция	Планови мерки за управление
1	ДЕЙНОСТ А.Т. 3.2.1. „Съдействие за функционирането на местна подсистема за комуникация на SILCNET LABEL на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“, на български и английски език.						
1.1	Представяне на Доклад за резултат DT.2.3.1 „Съдействие за функционирането на местна подсистема за комуникация на SILCNET LABEL на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“, на български език на хартиен и електронен носител	Неефективна комуникация с водещия партньор по проекта, относно функционирането на цялостната система и на местната подсистема за комуникация на SILCNET	1	3	4	Избягване	Съдействие от ИУ-Варна за комуникация с чуждестранните партньори
		Неефективна комуникация с участници в местна	2	3	7	Минимизиране	Съдействие от браншовите туристически организации за



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



		подсистема за комуникация на SILCNET					комуникация с местна подсистема за комуникация на SILCNET
		Липсата на достатъчна адекватна информация за участници в местна подсистема за комуникация на SILCNET	2	3	5	Минимизиране	Използване на допълнителна информация от емпирични изследвания и др. официални източници
		Поява на технологични пречки при функционирането на местната подсистема за комуникация на SILCNET	2	3	5	Минимизиране	Използване на ИТ специалисти от ИУ-Варна за решаване на технологични проблеми
1.2	Представяне на предварителен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата	Кратък срок изготвяне на доклада	1	2	3	Избягване	Стриктен контрол от ръководителя на екипа за срочно изпълнение на задачите
	Представяне на забележки от Възложителя	Забавяне на бележките от Възложителя	1	2	3	Избягване	Постоянна комуникация с възложителя за оказване на съдействие при затруднения
2.	Представяне на окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“	Неефективна комуникация с водещия партньор по проекта, относно системата за комуникация на SILCNET	1	3	3	Избягване	Съдействие от ИУ-Варна за комуникация с водещия партньор
		Неефективна комуникация с партньорите по проекта относно системата за комуникация на SILCNET	2	3	5	Минимизиране	Съдействие от ИУ-Варна за комуникация с чуждестранните партньори
		Кратък срок за коригиране на доклада	2	3	6	Избягване	Стриктен контрол от ръководителя на екипа за срочно изпълнение на задачите



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



3. Съгласно ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ в изготвянето на доклад А.Т3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ за изпълнение на Дейност А.Т3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ се включват следните основни части:

1. ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. Описание на планираните дейности, целите, очаквани резултати и методи за постигане на резултатите

Окончателният доклад „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ за изпълнение на Дейност А.Т3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ ще съдържа два документирани резултата: D.T3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“ и D.T3.3.2 „Съдействие при разработването на Приложение за разпознаване на SILC местоположение“

Приложението за разпознаване на SILC местоположение ще бъде фокусирано върху културните туристически ценности в отпечатъка на местните култури на Пътя на коприната. То ще бъде средството за насърчаване на участието и за повишаване на осведомеността на заинтересованите страни. Ще се консултира създаването на дизайн и ще се съдейства за разработването на приложение за SILC местоположението за мобилен телефон (смартфон) и таблет на Android и iOS от гръцкия партньор. Приложението ще бъде свързано с базата данни на уеб-ГИС и ще предоставя на всички потенциални потребители цялата налична информация за културните и туристическите ресурси, свързани с наследството на Пътя на коприната. (връзката ще се осъществява чрез търсене на базата на карта или търсене на текст).

Потребителите ще могат да прилагат специфични филтри (свързани с геолокация, време, вид продукти и т.н.) и ще могат да достигнат до съответната информация чрез карта и / или списък.

Работният процес ще бъде осъществен в следните три стъпки.

Първата стъпка – извършване на анализ на функционалния и на оперативния дизайн на приложението.

Втора стъпка - графичен дизайн на приложението. Специално внимание ще се обърне на условието, че концепцията да бъде приведена в съответствие с визуалната идентичност на проекта SILC.

Третата стъпка – създаване на съдържанието на приложението (doc, pdf, jpeg / jpg и т.н.) и базите от данни (xls).

Като изпълнител ще изпълним задължението да предоставим данни на английски и на български език.

Ще съдействаме през целия период на договора за популяризиране на целия проект чрез уеб и социални медии.

Работата ни по изпълнение на дейността ще бъдат насочена към това, приложението за разпознаване на местоположението да засили конкурентоспособността на заинтересованите страни по Пътя на коприната.

Ще съдействаме чрез приложението за разпознаване на SILC местоположение, щото членовете на мрежата, които вече са изобразени на интерактивната уеб-ГИС карта и са в рамките на виртуалната обсерватория на проекта SILC, да могат да образуват местни предприемачески вериги за клъстери в туризма.



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



С разработването на Приложението за геолокация SILC ще се стремим за постигането на следните цели:

➤ Подобряване на информираността по Пътя на коприната и същевременно насърчаване на диверсифицираната марка SILCNECT, насочена към конкретни туристически сегменти.

➤ Засилване на предприемаческия дух по Пътя на коприната и създаване на добавена стойност за регионалния туризъм.

➤ Членовете на SILCNECT, използващи приложението за разпознаване на местоположението, ще могат да се насочат към нови пазарни сегменти на културния туризъм, напр. към свободно, независимо пътуващи и да увеличат продажбите и приходите чрез популяризиране на потенциала за туризъм и местните култури по Пътя на коприната. Тези връзки ще улесняват местните и междурегионалните партньорства и транснационалните синергии.

➤ Резултатът от всички гореспоменати стъпки ще създаде напълно ново и функционално локално приложение на всички езици на партньорите и на английски език, предоставящо цялата информация, свързана с културните и туристическите ресурси, свързани с опита на Пътя на коприната.

Като продукт от изпълнението на Дейност А.Т3.4 от обществената поръчка ще бъдат изготвени следните документи:

Доклад за резултат D.T.3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“.

Докладът ще съдържа:

Първо, анализ на функционалния и на оперативния дизайн на приложението.

Второ, осъществен принос към разработването на графичен дизайн на приложението, съответстващ на визуалната идентичност на проекта SILC.

Трето, осъществен принос към изготвянето на съдържанието на приложението(doc, pdf, jpeg / jpg и т.н.) и базите от данни (xls).

Предоставените данни в доклада ще бъдат на английски и на български език.

Доклад за резултат D.T.3.3.2. „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“

Докладът ще съдържа предложения за съдействие относно:

- възможности за използване на приложението;
- набор от данни;
- интегриране на данни с уеб платформата на ГИС;
- предоставяне на качествени данни;
- превод на предоставената информация, свързана с културното наследство по Пътя на коприната.

2. Последователност на планираните дейности


Изпълнението на основна дейност Дейност А.Т3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ от поръчката ще се реализира в три основни етапа, обвързани в логическа последователност. Всеки от етапите ще включва конкретни дейности, които ще осигурят постигането на съответните цели и задачи от предмета на поръчката. Логическата последователност на етапите е показано на **фигура 3.1.**



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture

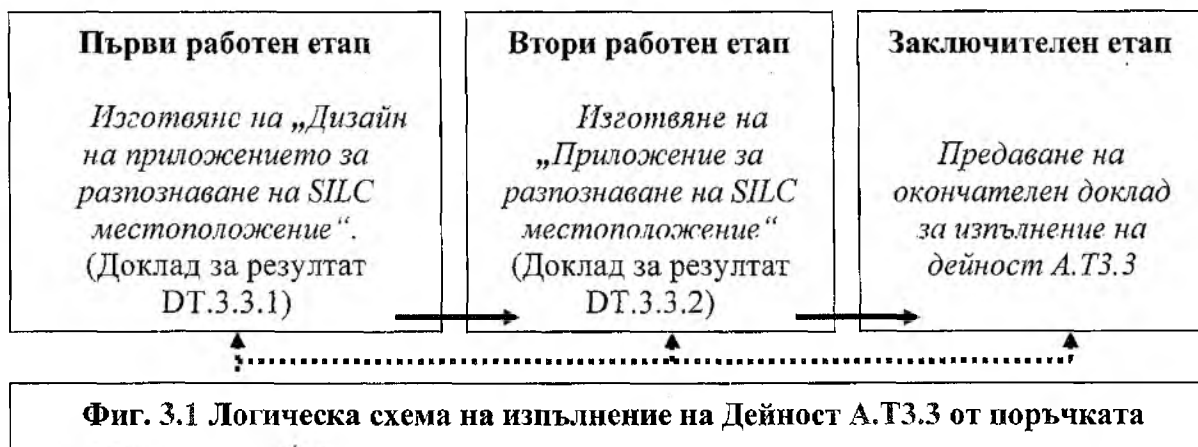

3. План-график на изпълнението на поръчката по техническа спецификация за изпълнение на Основна дейност A.T3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“

Предлагаме срокове за изпълнение на поръчката по спецификацията както следва.

Първо, предаване на Доклад за резултат D.T.3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“, на български и английски език в срок до 17.07.2021г.

Второ, предаване на Доклад за резултат D.T.3.3.2. „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ на български език и английски език в срок до 19.02.2021г.

Трето, предаване на окончателен доклад за изпълнение на Основна дейност A.T3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ на български език и английски в срок до 26.02. 2021г.

Подробен индикативен график на реализиране на основните дейности и резултати по тях е представен в таблица 3.1

Таблица 3.1

ГРАФИК за изпълнение на Дейност A.T3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“

№:	ДЕЙНОСТИ и РЕЗУЛТАТИ	Срок на изпълнение
1	ДЕЙНОСТ D.T.3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“.	1.07.2020-31.07.2020
1.1	Съдействие за изготвяне на Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“.	1.07.2020-17.07.2020
1.2	Представяне на предварителен Доклад за резултат D.T.3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“, на български език на хартиен и електронен носител	17.07.2020
1.3	Представяне на забележки от Възложителя	24.07.2020
1.4	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T.3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“, на	31.07.2020



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



	български и на английски език на хартиен и електронен носител	
2	ДЕЙНОСТ D.T.3.3.2. „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“	1.08.2020-26.02.2021
2.1	Съдействие за изготвяне на Приложение за разпознаване на SILC местоположение	1.08.2020-05.02.2021
2.2.	Представяне на предварителен Доклад за резултат D.T.3.3.2. „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ на български език на хартиен и електронен носител	05.02.2021
2.3.	Представяне на забележки от Възложителя	12.02.2021
2.4.	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T.3.3.2. „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ на български и на английски език на хартиен и електронен носител	19.02.2021
	Представяне на окончателен доклад за изпълнение на Дейност A.T3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ на български и на английски език на хартиен и електронен носител	26.02.2021

II. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1. Разпределение на наличния ресурс (човешки и технически) и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в изпълнението на всяка една от дейностите

ФИЛ“ ООД разполага с необходимите технически и кадрови ресурси за качествено изпълнение на Дейност A.T3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ от обществената поръчка с предмет “Предприемаческа мрежа по Пътя на коприната“. Фирмата е осигурила необходимите ключови експерти в съответствие с характера на планираните за реализация дейности. Списъкът на екипа от ключови експерти (КЕ), ангажирани за изпълнение на поръчката е представен в предложението по първата спецификация в т.1. от настоящата оферта. (виж списък на екипа ключови експерти в т.1).

Изпълнителят ще използва и други експерти, които по негова преценка са необходими за своевременно и качествено изпълнение на обществената поръчка.

Разпределение на участието на ключовите експерти по дейности в рамките на изпълнението на Дейност A.T3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ от обществена поръчка с предмет: “Предприемаческа мрежа по Пътя на коприната“ е представено в таблица 3.2.

Таблица 3.2

Разпределение на участието на ключовите експерти в изпълнението на Дейност A.T3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“

N:	ДЕЙНОСТИ и РЕЗУЛТАТИ	Участие на ключовите експерти				
		КЕ1	КЕ2	КЕ3	КЕ4	КЕ5
1	ДЕЙНОСТ D.T.3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“.					



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



1.1	Съдействие за изготвяне на Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение	X	X	X	X	X
1.2	Представяне на предварителен Доклад за резултат D.T.3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“ на български език на хартиен и електронен носител	X				
1.3	Представяне на забележки от Възложителя					
1.4	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T.3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“ на български и на английски език на хартиен и електронен носител	X				
2	ДЕЙНОСТ D.T.3.3.2. „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“					
2.1	Съдействие за изготвяне на Приложение за разпознаване на SILC местоположение	X	X	X	X	X
2.2.	Представяне на предварителен Доклад за резултат D.T.3.3.2. „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ на български език на хартиен и електронен носител	X				
2.3.	Представяне на забележки от Възложителя					
2.4.	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T.3.3.2. „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ на български и на английски език на хартиен и електронен носител	X				
	Представяне на окончателен доклад за изпълнение на Дейност A.T3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ на български и на английски език на хартиен и електронен носител	X				

2. Механизъм на взаимодействие и координация между експертите



Фиг 3.2. Органиграма на екипа за изпълнение на поръчката

Ще се създаде ефективна организационно-комуникационна структура между ключовите експерти от една страна и между изпълнителя и възложителя от друга страна.

С възложителя ще контактува ръководителят на екипа KE1 като своевременно ще информира всички останали ключови експерти.

Механизмът за комуникация, взаимодействие и координация между двата екипа на изпълнителя и екипа на възложителя е представен в органиграмата на **фиг. 3.2**

3. Методи за гарантиране на устойчивост на резултатите

Устойчивостта на резултатите от изпълнението на поръчката се определя от възможността те да служат за цялостното изпълнение на проекта SILK и основно за:

Първо, създаване на *дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение*.

Второ, *изготвяне на Приложение за разпознаване на SILC местоположение*

Трето, създаване на виртуална обсерватория.

Устойчивост на резултатите ще се осигури на следната основа и със следните методи:

Първо, устойчивост, осигурена от използването на качествени експерти с дългогодишен опит в теорията и практиката на туризма

Второ, устойчивост от подробното планиране, организиране, изпълнение и контрол на дейностите и операциите в съдържанието на поръчката



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



Трето, устойчивост на основата на публичност и прозрачност на извършваната работа чрез ангажиране на голям брой представители на всички заинтересовани страни.

Четвърто, устойчивост на основата на мащабна комуникация на постигнатите резултати чрез научни доклади и перманентна информация в средствата за масова информация и в социалните мрежи.

III. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1. Основни потенциални рискове за изпълняваните дейностите.

Дефиниция на риска, класификацията на категориите рискове, скалите за оценка на вероятността за събъждане и въздействието на всеки един риск, както и начинът за изчисляване на рейтинга на всеки идентифициран риск са представени в предложението по спецификацията в т.1.

2. План за Управление на риска

Стратегията и планът за управление на риска при изпълнение на настоящата дейност са идентични като методология на описаните в предложението по първата спецификацията в т.1 на настоящата оферта. Процесите по управление на риска включват:

Първо, планиране управлението на риска – избор на подход, планиране и изпълнение на операции по управление на проектните рискове;

Второ, идентификация на рисковете – определяне на това какви рискове е възможно да възникнат и какви са техните характеристики;

Трето, качествен анализ на проектните рискове – разполагане на рисковете по приоритет, вероятност за възникване и степен на въздействие;

Четвърто, количествен анализ на проектните рискове – количествена оценка на влиянието на проектните рискове върху общите цели на проекта;

Пето, планиране на действия в отговор на възникване на рисковите събития – разработване на различни варианти и действия за повишаване на благоприятното въздействие и намаляване на заплахите за постигането целите на проекта;

Шесто, наблюдение и управление на рисковете – следене на идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчните рискове, идентифициране на нови рискове, изпълнение на планове в отговор на рисковете и оценка на ефективността през жизнения цикъл на проекта.

За нуждите на изпълнението на настоящата поръчка предлагаме използването на следните 3 стратегии за управление на риска:

- **избягване на риска** – стратегия, при която се намалява вероятността от събъждане на риска;
- **минимизиране на ефекта** при събъждане на риска – стратегия, при която се намаляват последствията от събъждането на риска;
- **планове за извънредни действия** – стратегия, при която приемаме риска и е предвиждаме мерки за справяне с него, ако той се събдне;

3. Риск регистър: мерки за предотвратяване или преодоляване на рисковете за всяка от дейностите

Предлагаме вариант на риск-регистър при изпълнението на Дейност А.Т3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ от обществена поръчка с предмет: „Виртуална обсерватория по Пътя на коприната“ както следва в таблица 3.3. В

таблицата са описани категориите в които попадат рисковете по дейности, оценки за вероятност за възникване и влияние върху изпълнението, рейтинг на риска, реакция, планирани мерки за предотвратяване или прекратяване на риска.

Таблица 3.3

РИСК-РЕГИСТЪР

на осъществяването на Дейност А.Т.3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ от обществена поръчка с предмет: „Виртуална обсерватория по Пътя на коприната“ по проект „Местната култура по Пътя на коприната“ / “SILC Road local culture”

N	ДЕЙНОСТИ и РЕЗУЛТАТИ	Риск	Вероятност от 1 до 3	Въздействие от 1 до 3	Рейтинг от 1 до 9	Реакция	Планови мерки за управление
1	ДЕЙНОСТ Д.Т.3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“						
1.1	Съдействие за изготвяне на Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“	Неефективна комуникация с ведещия партньор и останалите партньори по проекта, относно структурата и съдържанието на Приложението	1	3	5	Избягване	Съдействие от ИУ-Варна за комуникация с чуждестранните партньори
		Липса на желание на участниците в мрежата да съдействат с идеи относно дизайна на Приложението	2	2	5	Минимизи ране	Провеждане на разяснително- мотивационна кампания сред участниците в мрежата SILCNET
		Формално подхождане от страна на партньорите относно идеи за дизайна на Приложението	1	1	3	Избягване	Интензивна комуникация с чуждестранните партньори и с участниците в мрежата SILC
		Формулиране на неясни указания от страна на ведещия партньор относно дизайна на Приложението	1	1	5	Избягване	Интензивна комуникация с ведещия партньор за своевременно получаване на ясни инструкции
1.2	Представяне на предварителен Доклад за резултат Д.Т.3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC	Неефективна комуникация между Възложителя и изпълнителя	1	3	3	Избягване	Фиксиране на дати и часове на работни срещи Ефективна комуникация с



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



	местоположение“ на български език на хартиен и електронен носител	относно съдържанието на доклада					посочени срокове
1.3	Представяне на забележки от Възложителя	Забавяне на бележките от Възложителя	1	3	3	Избягване	Постоянна комуникация с възложителя за оказване на съдействие при затруднения
1.4	Представяне на окончателен Доклад за резултат D.T.3.3.1 „Дизайн на приложението за разпознаване на SILC местоположение“, на български и на английски език на хартиен и електронен носител	Кратък срок за корекции на доклада	2	3	6	Избягване	Стриктен контрол от ръководителя на екипа за срочно изпълнение на задачите
2	ДЕЙНОСТ D.T.3.3.2. „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“						
2.1.	Съдействие за изготвяне на Приложение за разпознаване на SILC местоположение“	Неефективна комуникация и координация с водещия партньор по проекта и с останалите партньори, относно работата по изработване на Приложението	1	3	3	Избягване	Съдействие от ИУ-Варна за комуникация с чуждестранните партньори
		Технологични пречки при разработване на Приложението	2	3	6	Избягване	Привличане на ИТ специалисти от ИУ за решаване на технологичните проблеми
		Нежелание на участници в мрежата SILCNET да съдействат при разработването на съдържанието на приложението	2	3	6	Минимизиране	Разяснителна комуникационна кампания за ползите от разработването на приложението
2.2.	Представяне на предварителен Доклад за резултат D.T.3.3.2. „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ на български език на хартиен и електронен носител	Неефективна комуникация между Възложителя и изпълнителя относно съдържанието на доклада	1	3	3	Избягване	Фиксиране на дати и часове на работни срещи Ефективна комуникация с посочени срокове



Project funded by
EUROPEAN UNION



Silk Road Local Culture



2.3.	Представяне на забележки от Възложителя	Забавяне на бележките от Възложителя	1	3	3	Избягване	Постоянна комуникация с възложителя за оказване на съдействие при затруднения
2.4	Представяне на окончателен Доклад за резултат Д.Т.3.3.2. „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ на български и на английски език на хартиен и електронен носител	Кратък срок за корекция на доклада	2	3	6	Избягване	Стриктен контрол от ръководителя на екипа за срочно изпълнение на задачите
	Представяне на окончателен доклад за изпълнение на Дейност А.Т.3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“ на български и на английски език на хартиен и електронен носител	Кратък срок за изготвяне на доклада	2	3	6	Избягване	Стриктен контрол от ръководителя на екипа за срочно изпълнение на задачите

3. В процеса на изготвяне на анализа ще спазваме указанията от Насоки за изследването, налични по дейност **А.Т.3.1 „Уеб-платформа на Виртуалната обсерватория на местните култури По Пътя на коприната (SILC)“, А.Т.3.2 „Улесняване на комуникацията в SILCNET мрежата“ и А.Т.3.3 „Приложение за разпознаване на SILC местоположение“** приложени към спецификацията.

3. Ще предоставям на възложителя предварителен вариант на доклада на български език за одобрение. Окончателният документ ще бъде изготвен и предоставен на български и английски език.

4. При изготвянето на документа, ще спазваме изискванията за публичност и визуализация на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“.

5. При издаване на фактура, в същата задължително ще присъства следния текст: „Този разход е извършен по проект BSB570 „Местната култура по пътя на коприната“/ „SILC Road local culture“, финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“.

Дата	27.04.2020
Име и фамилия	Георги Филипов
Подпис на лицето (и печат)	

